

100
100

昭和一九二二—一九二二—一九二二—

要塞建築
勤務第六中隊

陣中日誌

6/7

沖
繩
200

原本史料

防衛研修所戦史室

軍事秘密

自昭和十九年十二月一日
至昭和十九年十二月三十一日

100
100

RC 02330
CinCPac-CinCPac
B- 24949
OKINAWA 10 JULY

陣中日誌

22090


要塞建築勤務第六中隊

100
100

昭和十九年十二月分

陸軍
中
日
士
心

北飛行場五六飛大派遣
通信班

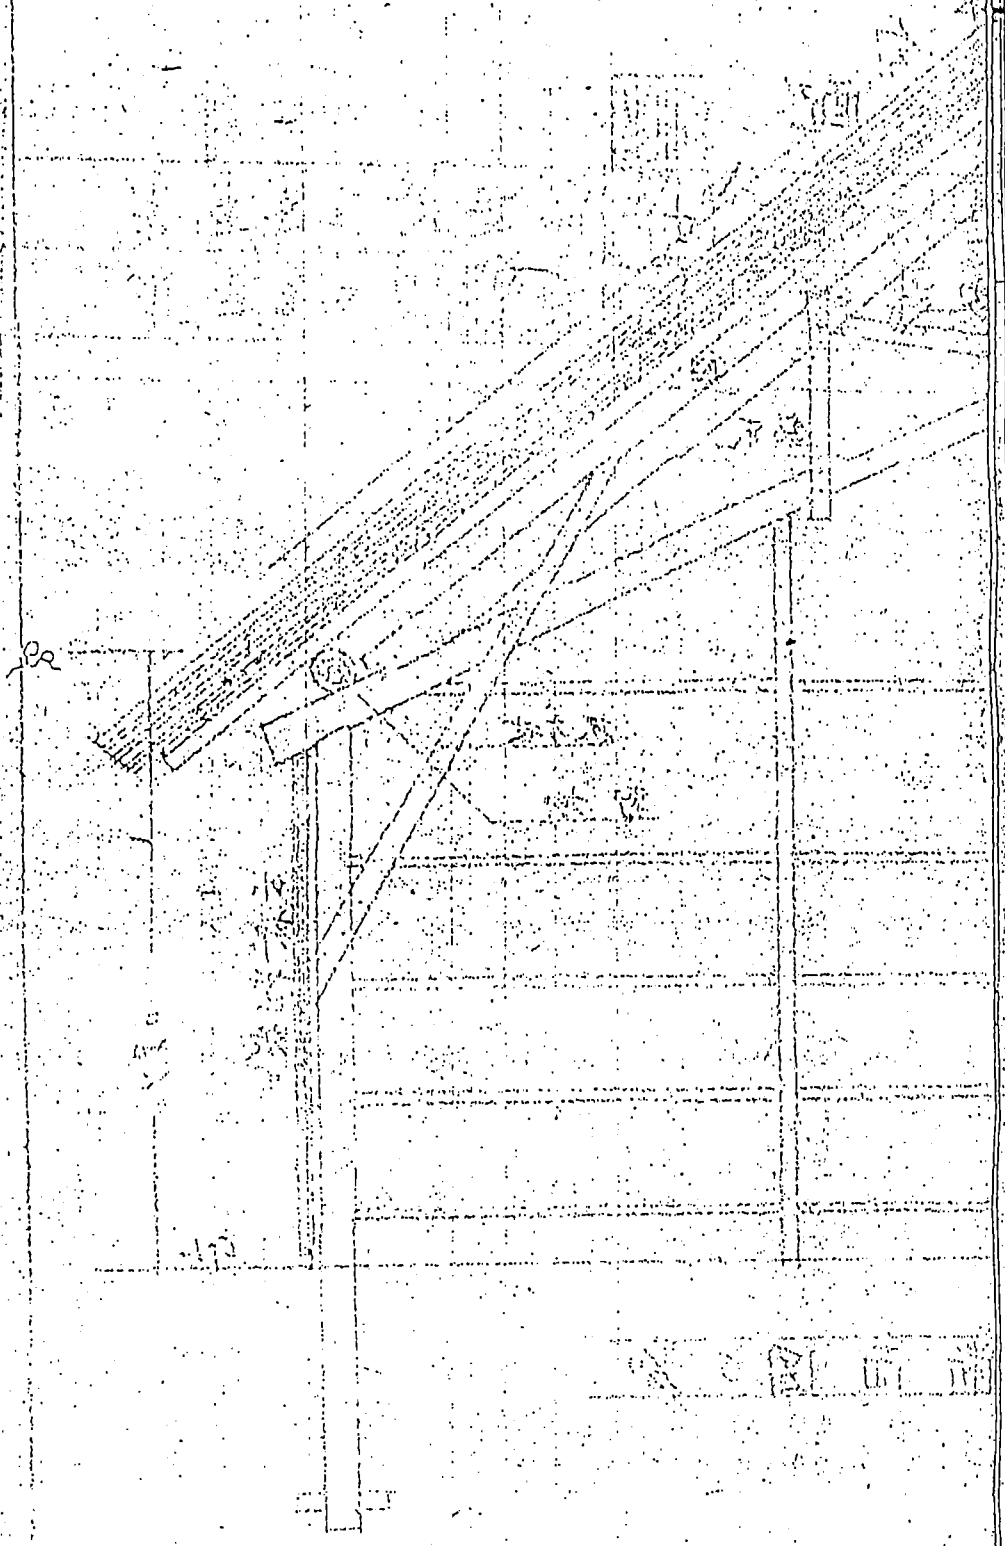

衛 生

十月三日

曇 天

行 勤

實働時間 各班共九時間
入院三人室二

出場人員 下士官一 女三八

作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長ハ女三名ヲ
區署シ 丘ノ各作業ヲ續行セリ

(イ) 宮田上等女ハ女二名ヲ指揮シ前日ニ引續
キ便所移轉及 洞窟施設作業ニ從事セリ
進度便所移轉完了 洞窟施設迄ニケ所
完了

(ロ) 荒武上等女ハ女二名ヲ指揮シ松立木伐採
及 鍛工場設置並ニ木工雜作業ニ從事セリ
進度 松立木伐採ニ五四九石 鍛工場切木間四〇〇
行

陣中日誌用紙

陸 軍

衛 生

十月三日

晴 天

行 勤

米 設置六分通り迄 トロツ柱箱修理ニ了
實働時間 各班共九時間
入院三人室二
出場人員 下士官一 女三八

作業隊長ノ命ニ依リ重信伍長ハ女三名ヲ
區署シ 丘ノ各作業ヲ實施セリ

(イ) 宮田上等女ハ女九名ヲ指揮シ洞窟施設
作業ヲ續行セリ
進度 洞窟施設迄ニケ所完了

(ロ) 荒武上等女ハ女二名ヲ指揮シ軍人俱樂部
部改築 及 木工雜作業ニ從事セリ
進度 軍人俱樂部内部改造ニ介通り迄
